

	담당	팀장	대표
결재			

국선생 리브랜딩 추진 계획

— 브랜드 이미지 재정비 및 신규 고객 확대 —



현 매장 외관 (직영 1호점)

I 추진 배경

- ☐ 브랜드 론칭 이후 매장 이미지 노후화
 - 20~30대 신규 고객 유입 감소
- ☐ 배달 · 밀키트 중심으로 소비 방식 변화

II 추진 내용

구 분	내 용	비 고
로 고 · 서 체	BI 재정비, 간판 서체 통일	외부 협업
매 장	간판 · 메뉴판 · 인테리어 개선	직영점 우선
포 장	배달 용기 · 밀키트 포장 교체	단계 적용

III 추진 일정

디자인 확정 2026. 12.	▶	직영점 적용 2027. 2.	▶	전 가맹점 확대 2027. 4.
----------------------------	---	---------------------------	---	-----------------------------

※ 세부 예산은 별도 보고

IV 현황 분석

1. 매장 현황

- 2026. 9. 말 현재 운영 매장 총 148개 (직영 12개, 가맹 136개)
 ○ 개점 5년 이상 매장 94개(63.5%)로 간판 · 인테리어 노후 심화


〈표 1〉 운영 연차별 매장 현황

(단위: 개, %)

구 분	3년 미만	3~5년	5~10년	10년 이상	계
직영	2	3	4	3	12
가맹	18	31	52	35	136
합계	20	34	56	38	148
비율	13.5	23.0	37.8	25.7	100.0

2. 고객 구성 변화

[그림 1] 고객 연령대 구성 비교

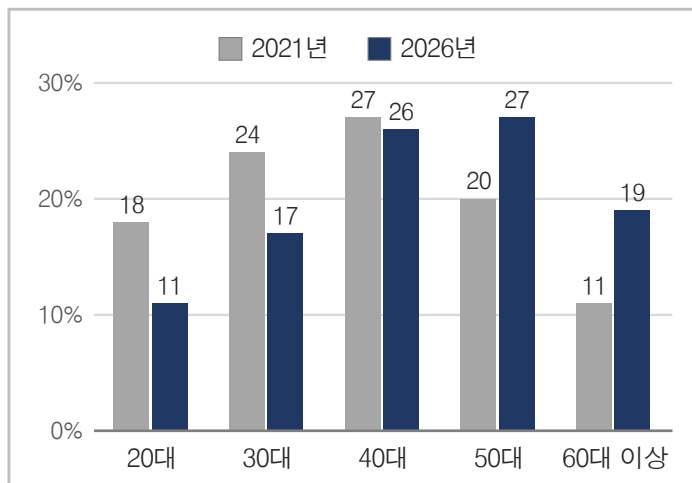

- 20~30대 비중 감소
 - 42% → 28% (△14%p)
 □ 50대 이상 비중 증가
 - 31% → 46% (+15%p)
 □ 신규 고객 유입 둔화
 - 신규 회원 가입 전년 대비
 △18%

※ 멤버십 · 카드 결제 고객 표본 분석 (2026. 8.)

3. 고객 인식 조사

〈표 2〉 항목별 만족도 비교

(5점 척도, n=1,200)

항목	국선생	업계 평균	차이	비고
맛 · 품질	4.3	4.0	+0.3	강점 유지
가격	3.9	3.7	+0.2	강점 유지
매장 분위기	3.1	3.8	△0.7	개선 필요
브랜드 세련도	2.8	3.7	△0.9	최우선 개선
포장 · 배달	3.0	3.6	△0.6	개선 필요

- 맛 · 가격 만족도는 높으나 매장 분위기 · 브랜드 이미지 열위
 ○ "맛은 좋은데 매장이 오래돼 보인다" 응답 다수 (주관식 1순위)
 ○ 배달 리뷰 중 '포장 부실' 언급 비중 23%로 개선 시급

※ 업계 평균은 동일 문항 외부 조사 결과 준용

V 세부 개선안


1. 분야별 개선안

〈표 3〉 현행 대비 개선안

구분	현행	개선(안)	기대 효과
BI(로고)	붓글씨 로고, 색상 5종 혼용	로고 단순화, 주 색상 2종으로 통일	인지도 · 일관성 제고
간판	매장별 제작, 규격 상이	표준 간판 3종(대 · 중 · 소) 규격화	제작비 15% 절감
메뉴판	메뉴 42종, 사진 없음	28종 축소, 사진 · 원산지 표기	주문 시간 단축
인테리어	짙은 목재, 형광등 조명	밝은 톤, 간접 조명, 1인석 확대	체류 만족도 향상
포장	일반 비닐 용기, 매장별 상이	전용 용기 · 밀키트 상자 통일	배달 평점 개선
유니폼	앞치마만 지급	상의 · 앞치마 · 모자 세트 지급	위생 이미지 강화

2. BI 개선 방향

- ☐ 기존 붓글씨 '국' 자 형태는 유지하고 획을 정리하여 친숙함 보존
- ☐ 주 색상 2종 + 보조 색상 1종으로 전 매체 통일

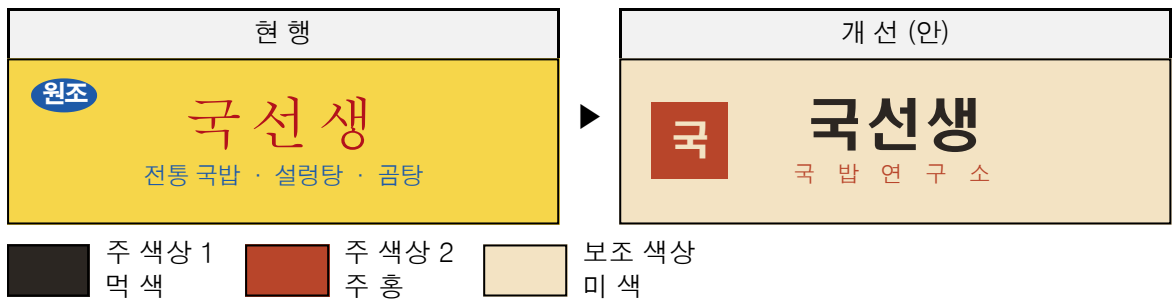

※ 외부 디자인 업체 3곳 비교 견적 후 선정 (2026. 11.)

3. 매장 유형별 적용 기준

〈표 4〉 유형별 적용 범위 및 비용

(단위: 개, 만원)

유형	대상	매장	적용 범위	점포당	본사 부담
A형 (전면)	10년 이상	38	간판 · 인테리어 · 메뉴판 · 조명	4,500	60%
B형 (부분)	5~10년	56	간판 · 메뉴판 · 조명	1,800	50%
C형 (간판)	5년 미만	54	간판 · 메뉴판	700	50%
계	—	148	—	—	—

- ☐ 직영 3개점(본점 · 역삼점 · 정자점) 시범 적용 후 전 매장 확대
 - 시범 매장 3개월 매출 · 고객 구성 변화 확인 후 가맹점 설명회 개최
 - 설명회 후 가맹점별 공사 일정 협의, 매장당 공사 기간 3일 이내

※ 가맹점 공사 비용은 최대 12개월 무이자 분할 납부 허용

VI 소요 예산 및 추진 일정

1. 소요 예산

〈표 5〉 연도별 소요 예산

(단위: 백만원)

구 분	2026	2027	2028	계
BI · 디자인 개발	180	40	—	220
직영점 개선	—	420	120	540
가맹점 공사 지원(본사 부담)	—	1,000	720	1,720
포장재 교체	—	260	90	350
홍보 · 마케팅	30	380	150	560
예비비	10	90	60	160
합 계	220	2,190	1,140	3,550

2. 세부 추진 일정

세부 과제	담당	2026	2027					2028	
		4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	상	하	
BI 개발 · 디자인 확정	경영기획		◆						
직영점 시범 적용	운영지원								
표준 간판 · 메뉴판 제작	구매								
가맹점 설명회	가맹사업			◆					
가맹점 A형 개선	가맹사업								
가맹점 B · C형 개선	가맹사업								
포장재 교체	구매								
통합 홍보 캠페인	마케팅								
성과 점검 · 보고	경영기획					◆		★	

※ ◆ 중간 점검, ★ 최종 보고 / 연한 막대는 집중 홍보 기간

VII 기대 효과 및 리스크

- 20~30대 고객 비중 28% → 35% 회복 (2028년 목표)
- 가맹점 월평균 매출 5% 이상 증가, 신규 출점 비용 절감
 - 표준 간판 · 포장재 일괄 구매로 연간 약 1.2억원 절감

〈표 6〉 주요 리스크 및 대응

리 스 크	대 응 방 안
가맹점 비용 부담 반발	본사 부담률 상향(A형 60%), 무이자 분할 납부
기존 단골 고객 이탈	로고 핵심 요소 유지, 기존 메뉴명 · 맛 변경 없음
공사 기간 매출 손실	야간 · 휴무일 공사, 공사 기간 로열티 면제

※ 세부 실행 계획은 디자인 업체 선정 후 별도 보고 (2026. 12.)
